

check list

PRE VOLO

Aliante e paracadute Controllati
Scheda volo Consegnata
Paracadute Indossato
Schienale e zavorra Come richiesto
Ruotino pivottante Tolto
Pedaliera Regolata

PRE DECOLLO

Cappottina Chiusa
Finestrino Chiuso
Diruttori Controllati e bloccati
Cavo traino Agganciati
Main switch Acceso
Variometro A zero
Anemometro A zero
Bussola 280°/110°
Emergenza cappottina A posto
Altimetro A zero
Pallina Ala bassa
Indicatore di virata Spento
Variometro elettrico Come richiesto
Radio Accesa
Frequenza radio 128,450 MHz
Volume radio Regolato
Comandi Liberi

PRE ACROBATICI




Cappottina e finestrino Chiusi
Diruttori Bloccati
Oggetti in cabina Fissi
Cinture di sicurezza Strette
Spazio sottostante Libero

IN PRENOTAZIONE

Quota di ingresso Oltre 300 mt.
Aeroporto Libero da ostacoli
Manica a vento Controllata
Traffico in circuito individuato
Aeromobili a terra Localizzati

IN SOTTOVENTO


Quota di ingresso 240 mt.
Velocità 95 Km/h
Chiamata radio Eseguita
Diruttori Provati
Cinture di sicurezza Serrate

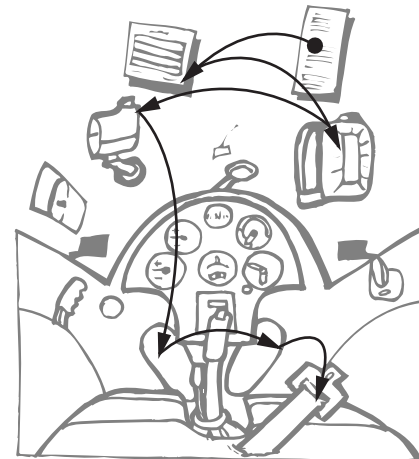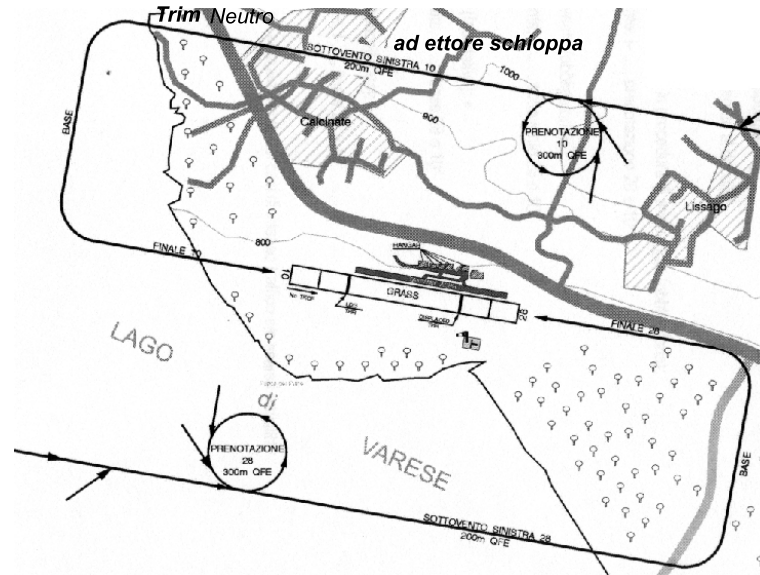


Pre Volo



Pre Decollo



Pre acrobatici

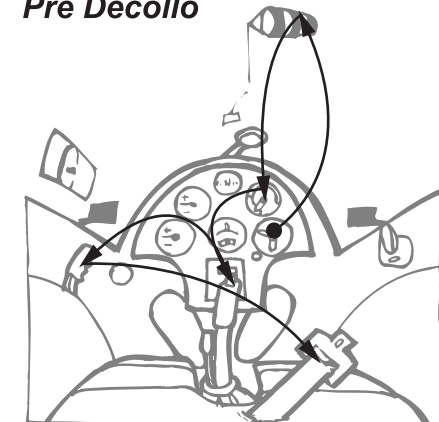

Prenotazione & Sottovento
